



Confraternização final de ano

**Integrantes: Júlia Karoline, Lívia Faria,
Lucas Faria e Wesley Bernardes**



Fundamentos que guiam o projeto: TAP, EAP e gestão de riscos

Contextualizar os três pilares que estruturam nossa apresentação e como eles se conectam ao projeto da confraternização.

- **TAP (Termo de Abertura do Projeto):** documento que autoriza formalmente o projeto, alinha objetivo, justificativa, entregas-chave, partes interessadas, orçamento e marcos.
- **EAP (Estrutura Analítica do Projeto):** decomposição hierárquica das entregas/atividades, garantindo clareza de escopo e base para estimativas, cronograma e responsabilidades
- **Gestão de Riscos:** processo contínuo de identificar, analisar, planejar respostas e monitorar incertezas (ameaças e oportunidades). Usaremos SWOT para mapear riscos críticos e ações.





Aplicando ao nosso projeto

Organizar a confraternização de fim de ano para aproximadamente 100 colaboradores, com estrutura completa de evento (espaço, buffet, atrações e cerimônia), executada dentro do orçamento e do cronograma, para promover integração, reconhecimento e fechamento positivo do ano.

01.

Planejar e executar o evento dentro do prazo e do orçamento aprovados, assegurando logística, fornecedores e operação no dia.

02.

Proporcionar uma experiência memorável aos participantes, alcançando alta satisfação e boa adesão ao convite.

03.

Garantir governança e qualidade com tap aprovado, eap como base do escopo e gestão de riscos ativa ao longo do projeto.



TAP – Requisitos e entregas

Requisitos Principais

- Aluguel do espaço do evento
- Contratação de buffet, música ao vivo e decoração
- Organização e entrega da premiação

Principais Entregas

- Lista de convidados confirmada
- Contratos com fornecedores
- Cronograma detalhado executado
- Evento realizado com sucesso
- Relatório final com lições aprendidas





TAP – Stakeholders e balanço financeiro

Participantes

- Diretores da empresa
- Gerentes de departamento
- Equipe de Recursos Humanos
- Colaboradores participantes
- Fornecedores externos

Principais Entregas

- R\$ 25.000,00 pré-aprovados pela diretoria


Cronograma das atividades


Visão das atividades com datas e responsáveis, servindo de base para acompanhar prazos, marcos e o progresso do projeto.

#	Atividade	Início	Duração (dias)	Término
1	Definição do orçamento (levantamento + aprovação)	01/09/2025	15	15/09/2025
2	Elaboração da lista de convidados	16/09/2025	15	30/09/2025
3	Definição da data e local (pesquisa + reserva)	01/10/2025	10	10/10/2025
4	Contratação de fornecedores (buffet, música, decoração, som/iluminação)	11/10/2025	20	31/10/2025
5	Premiação (critérios + compra de troféus)	01/11/2025	10	10/11/2025
6	Comunicação e divulgação interna (material + convites)	11/11/2025	10	20/11/2025
7	Montagem do espaço (palco, som, decoração)	26/11/2025	2	27/11/2025
8	Evento - Dia 1: Recepção, credenciamento, jantar, música, premiação, registro (foto/filmagem)	28/11/2025	1	28/11/2025
9	Evento - Dia 2: Continuidade, ajustes e encerramento operacional	29/11/2025	1	29/11/2025
10	Pagamento final aos fornecedores	30/11/2025	1	30/11/2025
11	Pesquisa de satisfação (questionário + consolidação)	01/12/2025	5	05/12/2025
12	Relatório final (financeiro + lições aprendidas)	06/12/2025	5	10/12/2025

Diagrama de gantt

Representação visual do cronograma, mostrando a duração, sequência e dependências das atividades ao longo do período planejado.

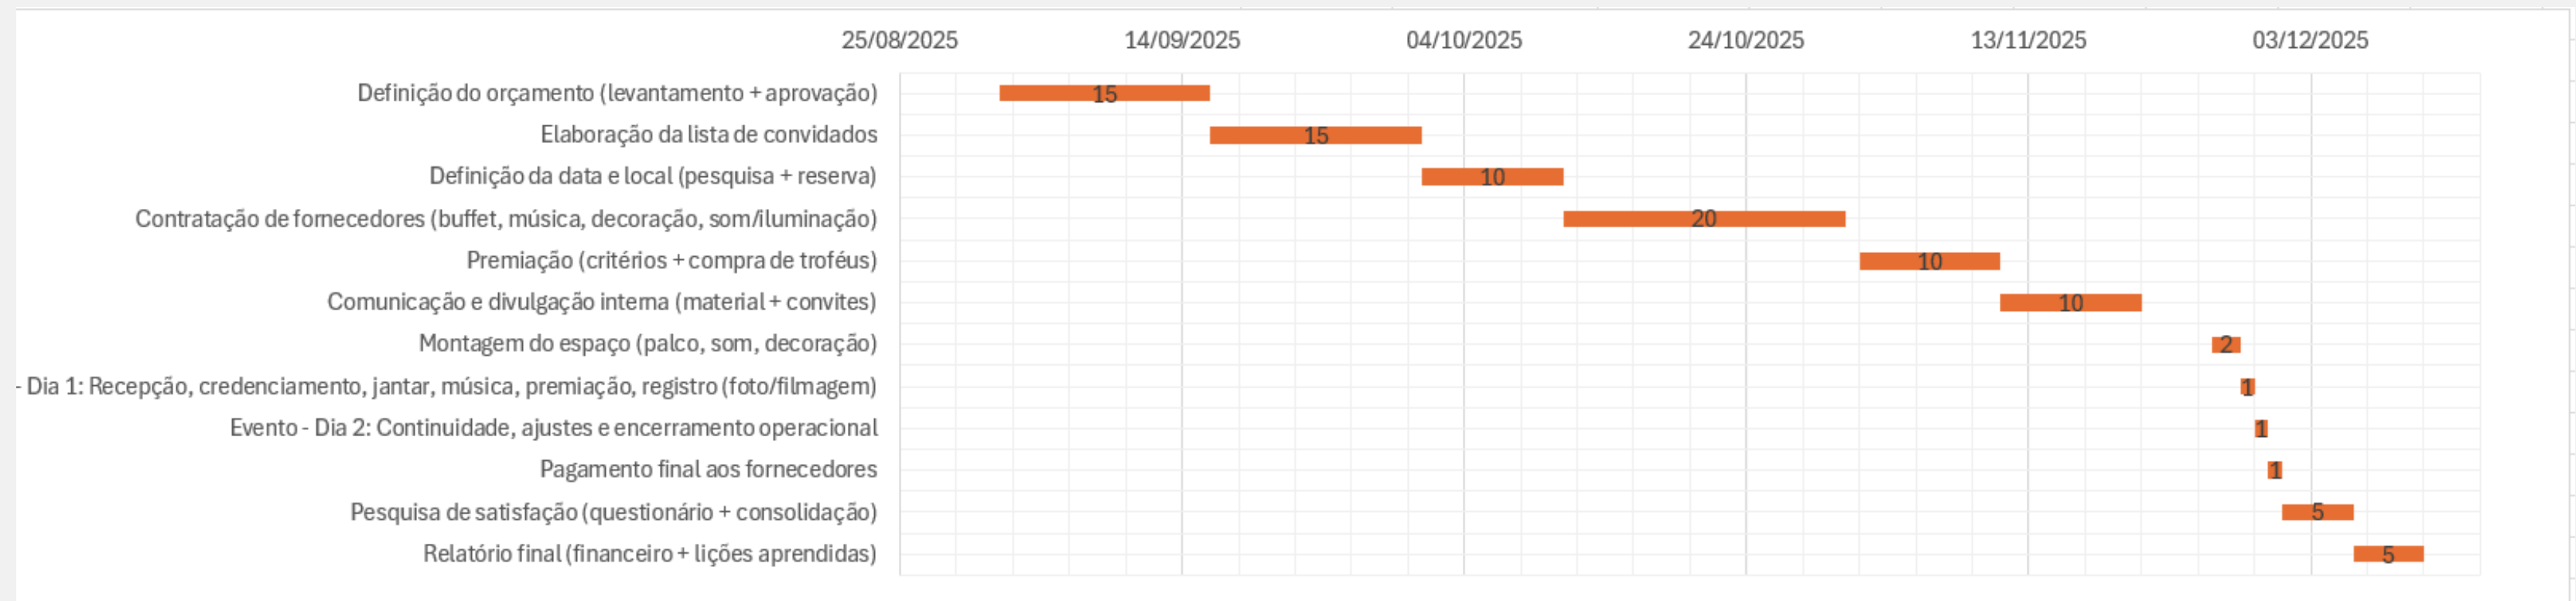



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)



01

PLANEJAMENTO

Definiremos o orçamento, elaboraremos a lista de convidados e fixaremos data e local do evento. Em seguida, contrataremos fornecedores, planejaremos a premiação e estruturaremos a comunicação e divulgação interna.



02

EXECUÇÃO


Montaremos o espaço, realizaremos a recepção e o credenciamento, seguiremos com o jantar e a apresentação musical. Conduziremos a cerimônia de premiação conforme roteiro e registraremos o evento em foto e vídeo.



03


ENCERRAMENTO

Efetuiremos os pagamentos finais aos fornecedores e aplicaremos a pesquisa de satisfação, consolidando os resultados. Por fim, entregaremos o relatório final com análise financeira e lições aprendidas.



EAP 01 – Planejamento


Definiremos orçamento, convidados, data e local; contrataremos fornecedores, planejaremos a premiação e estruturaremos a comunicação interna.

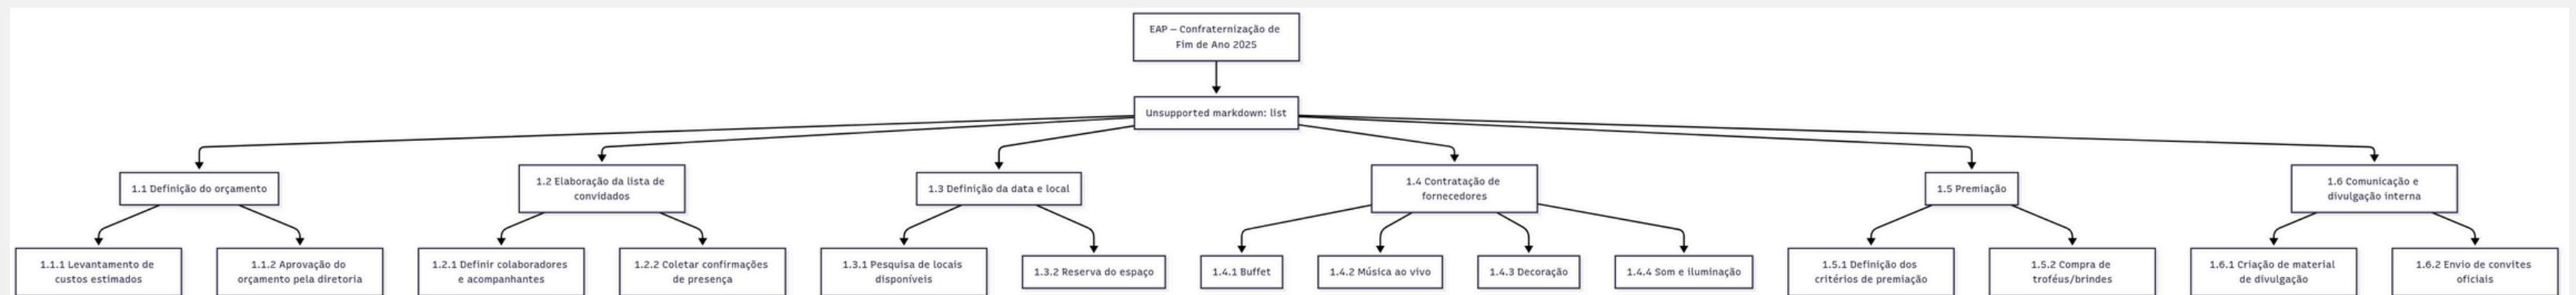

Link de acesso no mermaid: <https://www.mermaidchart.com/app/projects/466a5b4b-c9ef-4d8f-8f58-6bda7724f22a/diagrams/ffab181c-b2df-48ad-a316-ce25612d91e1/version/v0.1/edit>

EAP 02 – Execução


Montaremos o espaço, realizaremos credenciamento, jantar e atrações; conduziremos a premiação e registraremos o evento em foto e vídeo conforme roteiro.

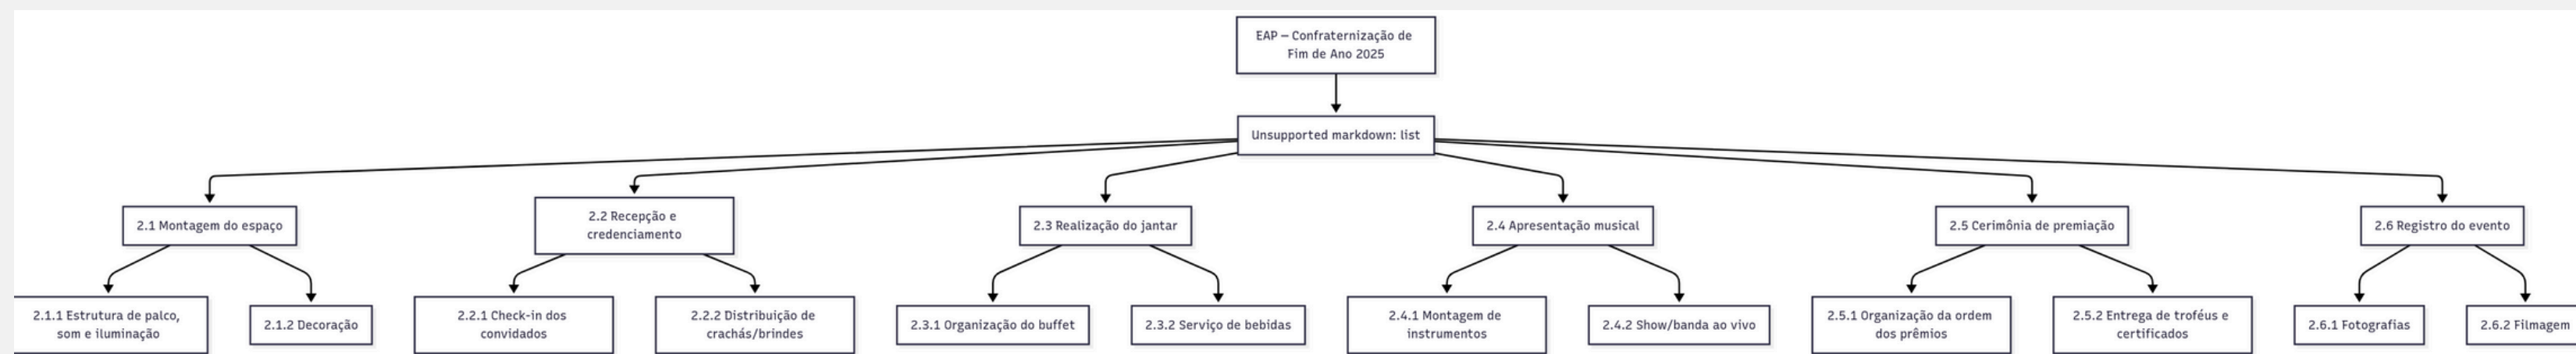

Link de acesso no mermaid: <https://www.mermaidchart.com/app/projects/466a5b4b-c9ef-4d8f-8f58-6bda7724f22a/diagrams/ebe1546e-fb7a-4d45-a5db-adb21434228f/version/v0.1/edit>

EAP 03 – Encerramento

Quitaremos fornecedores, aplicaremos e consolidaremos a pesquisa de satisfação e entregaremos o relatório final com análise financeira e lições aprendidas.

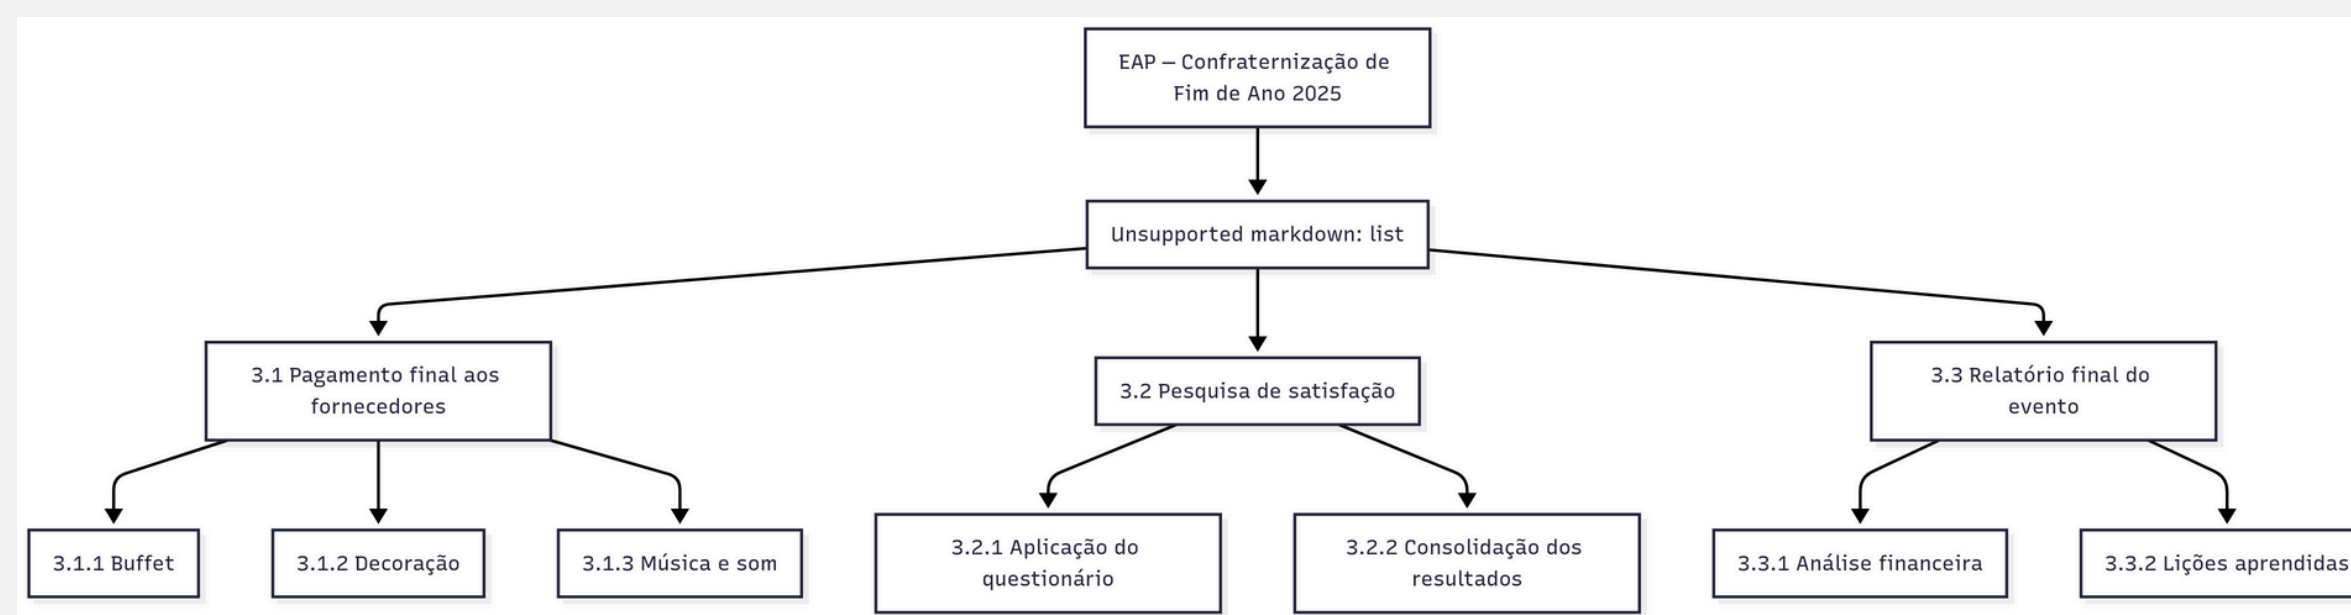

Link de acesso no mermaid: <https://www.mermaidchart.com/app/projects/466a5b4b-c9ef-4d8f-8f58-6bda7724f22a/diagrams/0c980050-e718-46e4-87c3-ba1922dddbc6/version/v0.1/edit>



Gestão de Riscos

Riscos identificados

- Possível atraso na contratação de fornecedores
- Estouro de orçamento devido a imprevistos
- Baixa adesão dos colaboradores ao evento

Impactos potenciais

- Comprometimento da qualidade do evento
- Necessidade de recursos adicionais
- Redução da satisfação dos participantes

Gestão de risco – Matriz SWOT


A matriz **SWOT** é uma ferramenta que mapeia forças e fraquezas (internas) e oportunidades e ameaças (externas).

No nosso evento, ela cruza orçamento e equipe com disponibilidade de fornecedores e agenda corporativa, apontando prioridades e riscos a mitigar.

S Forças (S) No que somos bons? • ORÇAMENTO PRÉ-APROVADO PELA DIRETORIA • EQUIPE EXPERIENTE EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS • APOIO DO RH E GERÊNCIAS	W Fraquezas (W) O que precisamos melhorar? • DEPENDÊNCIA DE FORNECEDORES EXTERNOS • PRAZO APERTADO PARA CONTRATAÇÕES
O Oportunidades (O) O que podemos aproveitar? • FORTALECER CULTURA ORGANIZACIONAL • RECONHECER COLABORADORES DESTACADOS	T Ameaças (T) O que pode nos prejudicar? • INDISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES • MUDANÇAS DE ÚLTIMA HORA

Diagrama Ishikawa

É uma ferramenta visual (diagrama de causa-e-efeito) que parte do problema e organiza possíveis causas em “espinhas” por categorias (pessoas, processo, método, TI, ambiente, oferta). Ajuda a enxergar causas-raiz e priorizar ações corretivas de forma rápida.

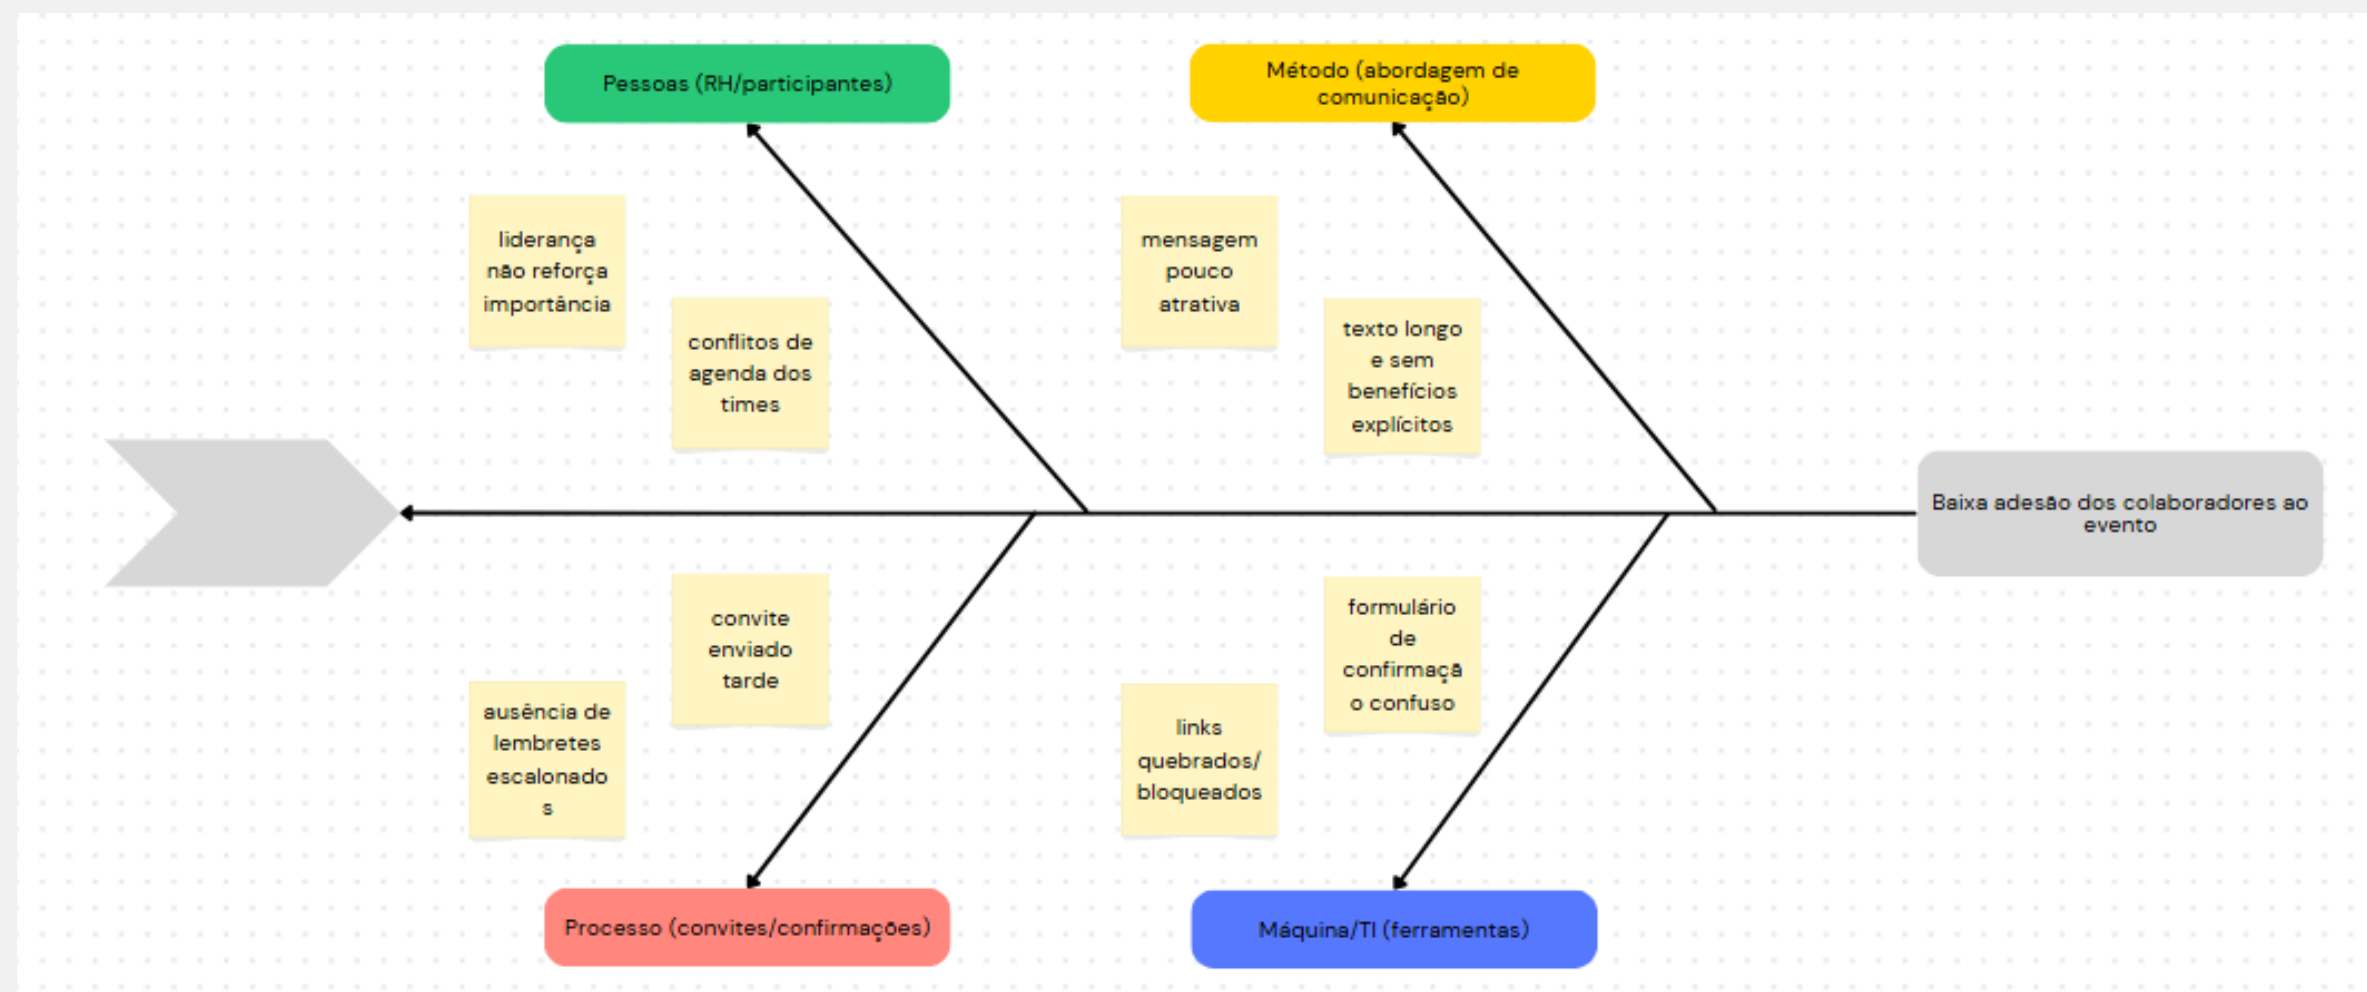

Conclusão

Encerramos o planejamento da confraternização 2025 com escopo, prazos, orçamento e riscos alinhados; abaixo, os principais entregáveis consolidados e o que vem na sequência.

- **TAP** consolidado: objetivos, escopo, stakeholders e critérios de sucesso
- **EAP** estruturada em planejamento, execução e encerramento
- **Cronograma e diagrama de gantt** prontos para acompanhamento
- **Riscos mapeados (swot)** com ações de mitigação previstas
- **Metas definidas:** $\leq$ r\$ 25.000, $\geq$ 90% satisfação, $\geq$ 80% adesão

Próximos passos: fechar contratos, iniciar comunicação interna e monitorar marcos e riscos semanalmente.



The background is a light gray color, decorated with various hand-drawn blue doodles. These include several loops and swirls at the top, a series of concentric arcs at the bottom left, a wavy line at the bottom center, and several checkmarks at the bottom right. On the far right edge, there are some vertical blue strokes that look like the letters 'W' or 'M'.

Obrigado
